


# Aushub- und Schachtarbeiten



Innerhalb der Gesellschaft gab es in den letzten 5 Jahren **mehr als 30 potentiell schwere Unfälle** im Zusammenhang mit Aushub- und Schachtarbeiten.

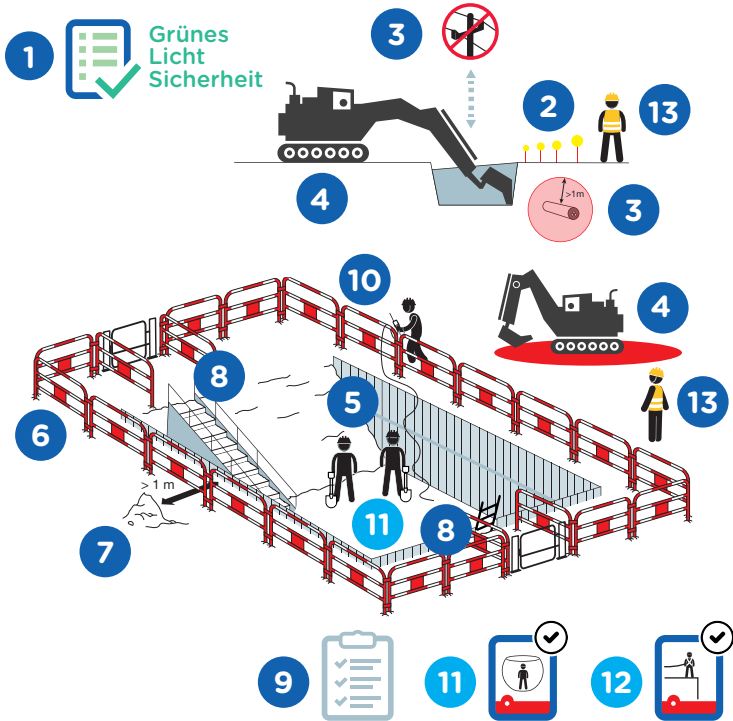

# Aushub- und Schachtarbeiten



Juni 2022

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Beobachtete Firma \_\_\_\_\_ Erlaubnis-Nr. \_\_\_\_\_

JA NEIN N/A

## ZU PRÜFENDE PUNKTE

1

Wurde die Überprüfung „Grünes Licht Sicherheit“ durchgeführt?

2

Sind identifizierte erdverlegte Leitungsnetze gegebenenfalls vor Ort kenntlich gemacht?

3

Wird bei vorhandenen Freileitungen und erdverlegten Leitungsnetzen ein Sicherheitsabstand eingehalten (>1 m bei Aushub mit sogenannten groben Methoden)?

4

Sind die Bagger stabil aufgestellt und befindet sich niemand im Bewegungsbereich der Baumaschine?

5

Wurden vor Begehung durch das Personal die Grubenwände gegen Einsturz abgesichert?

6

Ist der Aushubbereich abgegrenzt (feste materielle Schranke bei Absturzgefahr für Personen oder Baumaschinen)?

7

Wird am Grubenrand ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 m eingehalten, welcher frei von Aushubmaterial, Baumaschinen und Ausrüstungsgegenständen ist?

8

Sind vor dem Betreten durch das Personal abgesicherte Zugangsmittel (Rampen, Treppen, Leitern) angebracht?

9

Wurde die Grube vor dem Betreten durch Arbeitskräfte kontrolliert?

10

Wurde bei potentiell gefährlicher Atmosphäre vor Betreten der Grube bzw. vor Arbeitsbeginn die Atmosphäre überprüft?

In folgenden beiden Fällen ist die angegebene Checkliste anzuwenden:

11

Bei engen Räumen die Checkliste „Befahren enger Räume“

12

Bei Arbeiten in Höhe (Höhenunterschied > 1,5 m) Checkliste „Arbeiten in Höhe“

13

Ist bei Aufenthalt von Personal in der Grube (>1,3 m) oder bei eingeschränkten Sichtverhältnissen für den Baumaschinenführer bzw. bei Annäherung an ein vorhandenes Leitungsnetz eine Sicherheitsposten an Ort und Stelle?

Übereinstimmungsrate (Anzahl JA/anwendbare Punkte):      /      (      %)

Kommentare \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_
