


Lavori di scavo



Oltre 30 incidenti potenzialmente gravi correlati a lavori di scavo si sono verificati presso la Compagnia negli ultimi 5 anni.

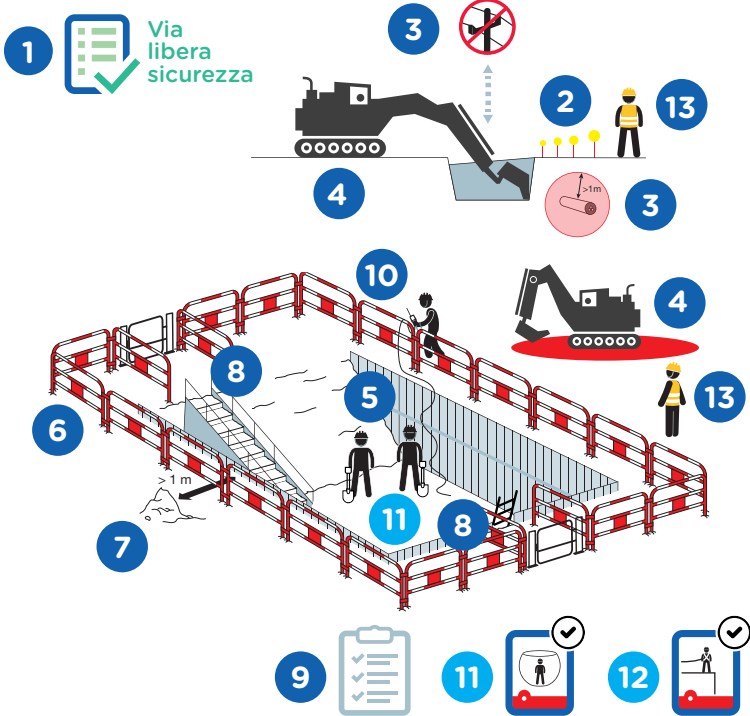

Lavori di scavo



Giugno 2022

Luogo _____ Data _____

Azienda osservata _____ Num. permesso _____

SÌ **NO** **N/A**

PUNTI DA CONTROLLARE

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | La verifica "Via libera sicurezza" è stata realizzata? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Le eventuali reti interrato identificate sono state rilevate fisicamente nel sito? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | È rispettata una distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree e dalle reti interrato (>1 m se scavo con metodi "aggressivi")? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | I mezzi di scavo sono posizionati in modo stabile e tale che non ci sia nessuno nella zona di movimento della macchina? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Le protezioni contro le frane sono state installate prima dell'entrata del personale? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | La zona di scavo è delimitata (barriera fisica rigida adattata se c'è rischio di caduta di una persona o di un macchinario)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Una distanza di sicurezza di almeno 1 m dal bordo dello scavo è tenuta libera da qualsiasi materiale estratto, macchinari o attrezzature varie? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Prima dell'entrata del personale, sono stati installati nello scavo mezzi di accesso sicuri (rampe, scale a pioli, scale) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | È stata eseguita un'ispezione dello scavo prima dell'accesso del personale? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | Se c'è una potenziale presenza di atmosfera pericolosa, è stata realizzata una verifica dell'atmosfera prima dei lavori o dell'entrata nello scavo? |

Per i due seguenti casi, utilizzare la lista di controllo menzionata:

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | Se spazio confinato, lista di controllo "Spazio confinato" |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | Se lavori in altezza (dislivello > 1,5 m), lista di controllo "Lavori in altezza" |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | Quando nello scavo è presente del personale (> 1,3 m) o se il conducente di mezzi non ha una buona visibilità o quando si avvicina a una rete esistente, è presente un sorvegliante? |

Tasso di conformità (Num. di SÌ/punti applicabili): _____ / _____ (_____ %)

Commenti _____

Nome _____ Azienda _____

Firma _____
