


Pompaggio con autocisterna



2 incidenti potenzialmente gravi correlati a lavori di scavo si sono verificati presso la Compagnia negli ultimi 5 anni.

- 1  Via libera sicurezza
- 2 
- 3 
- 4 

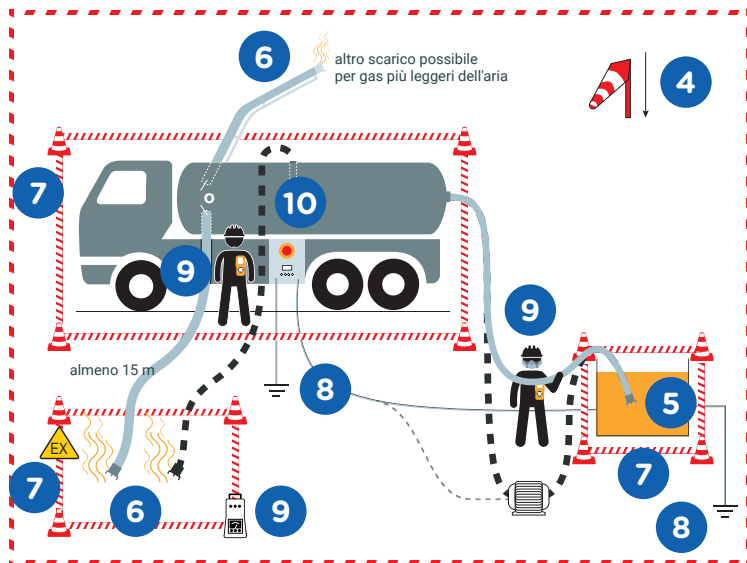

TotalEnergies



Pompaggio con autocisterna



Giugno 2022

Luogo _____ Data _____

Azienda osservata _____ Num. permesso _____

SÌ NO N/A

PUNTI DA CONTROLLARE

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | La verifica "Via libera sicurezza" è stata realizzata? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | La lista dei controlli da eseguire prima dell'inizio è stata fatta dalla squadra di intervento? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | L'operatore e il responsabile di bordo hanno un certificato di formazione/competenza per la loro funzione? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Il cantiere è allestito a seconda della direzione del vento e il camion e gli sfiati sono situati lontano da qualsiasi edificio? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Le caratteristiche e i rischi del prodotto da pompare sono noti alla squadra (inflammabile, tossico...), e la sua compatibilità con le attrezzature utilizzate è stata verificata? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Se gli scarichi gassosi non possono essere captati, sono canalizzati in una zona sicura (ad almeno 15 m dal camion sottovento; altrimenti e soltanto per i gas più leggeri dell'aria, sopra il camion, ad almeno 5 m da terra)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Il camion, la zona di pompaggio e la zona di scarico dello sfiato sono delimitati e, per la zona di scarico dello sfiato, dotati di segnaletica? (nelle stazioni di servizio: delimitazione attorno alla zona occupata dal cantiere) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Le messe a terra e il collegamento equipotenziale sono predisposti? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Un monitoraggio continuo dell'atmosfera è predisposto all'altezza della zona di pompaggio, del camion e dello sfiato? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | Il responsabile di bordo è vicino all'arresto di emergenza della pompa? |

Tasso di conformità (Num. di SÌ/punti applicabili): _____ / _____ (_____ %)

Commenti _____

Nome _____ Azienda _____

Firma _____
