


Hijswerken



6 doden bij hijswerkzaamheden binnen onze onderneming in de afgelopen tien jaar

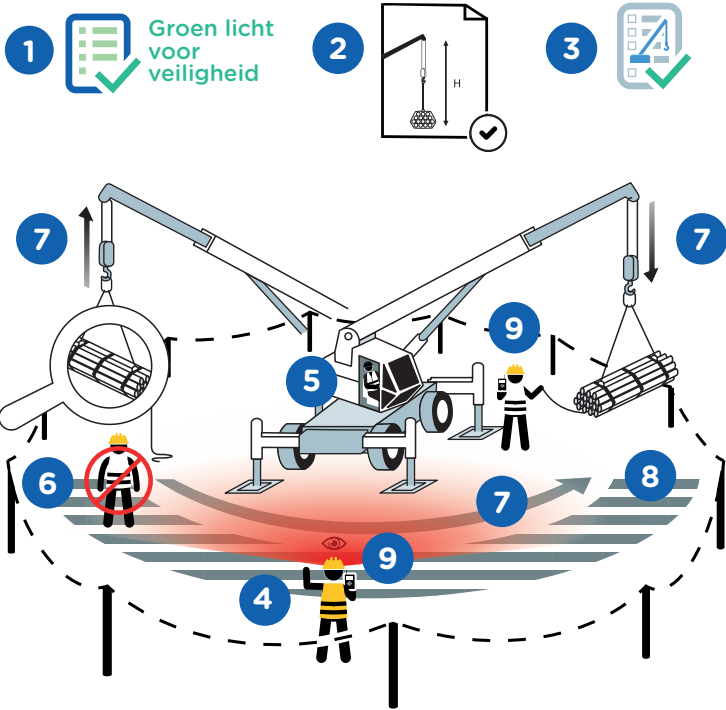

TotalEnergies



Hijswerken

Plaats _____ Datum _____

Beoordeelde onderneming _____ Vergunning nr. _____



Junij 2022

JA NEE N.V.T.

CONTROLEPUNTEN

1 Is de controle "Groen licht voor veiligheid" uitgevoerd?

2 Is er een goedgekeurd hijsplan beschikbaar?

3 Is de checklist vóór aanvang van het werk door het uitvoerend personeel afgewerkt?

4 Is er een seingever/hijsmeester aangesteld en herkenbaar?

5 Beschikt de machinist van het hijsmiddel over een opleidingscertificaat/erkenning voor het bedienen van het hijsmiddel?

6 Is er een fysiek afgesloten werkgebied ingericht en bevindt zich niemand onder of in de nabijheid van de hangende last?

7 Wordt het hijswerk uitgevoerd overeenkomstig het hijsplan/de stapsgewijze procedure? (bijv.: stropen, plaats van oppakken en neerzetten van de last, gebied waar de last overheen wordt verplaatst)

8 Zijn er geen apparaten onder druk aanwezig onder of in de nabijheid van de hangende last, tenzij specifiek in het hijsplan aangegeven?

9 Wordt de verplaatsbare last tijdens het hijsen onder controle gehouden?

Score (aantal x JA/aantal punten dat van toepassing is): _____ / _____ (%)

Opmerkingen _____

Naam _____ Onderneming _____

Handtekening _____
